


Monatsverlauf Projektstunden

Saeulen: geplante vs. erfasste Stunden je Monat · Linien: kumulierter Soll- und Ist-Verlauf · Gestrichelt: Prognose bei aktuellem Tempo

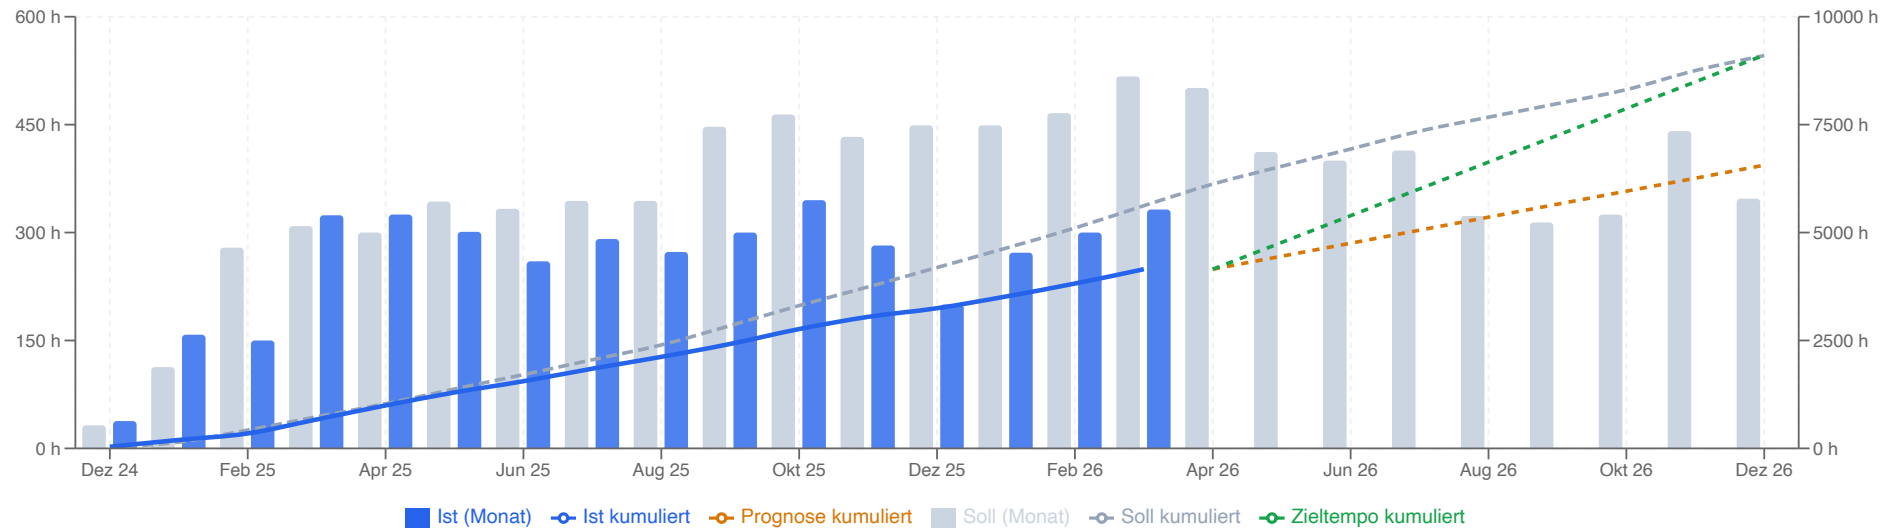

Nur foerderbare Projektstunden (is_billable = true). Soll-Verteilung gleichmaessig ueber AP-Laufzeit je Arbeitspaket.

🎯 Zielerreichungs-Prognose

⚠️ Gefaehrdet

HOCHRECHNUNG

Ziel (Plan)

9.110 h

Bisher verbucht

4.150 h

Prognose gesamt

6.559 h

Basis: 301 h/Monat (Team, letzte 3 Monate)

72% des Foerderziels

Fehlende Stunden bei aktuellem Tempo: **2.551 h**

AKTUELLE SITUATION

Aktive Mitarbeiter

3 / 5

Intensitaet je MA

4.7 h/Tag

Team gesamt

14.1 h/Tag

Basis: letzte 3 abgeschl. Monate

WAS WAERE NOETIG?

⚠ Weiter wie bisher (3 aktive MA)

4.7 h/Tag je MA

Team: 14.1 h/Tag

✅ Fuer 100% Ziel (alle 5 MA)

5.7 h/Tag je MA

Team: 28.3 h/Tag

Noch 8 Monate bis Projektende

Durchschnittswerte zur Orientierung. Individuelle Buchung je Mitarbeiter gemaess Arbeitsplan.

FOERDER-KONSEQUENZEN

⚠ Weiter wie bisher (3 aktive MA)

Abrufbar: **155.676 EUR**

Erreichungsgrad: **72%**

Verschenkt: 56.121 EUR

✅ Bei 100% Zielerreichung

Abrufbar: **211.797 EUR**

Verschenkt: **0 EUR**

Foerdersatz: 40% · Basis: echte Stundensaetze
